

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2022

CRFNT-107-2022

Dr. ÁLVARO EDGAR BALCÁZAR ACERO

Gerente General FONTUR

Dra. FERNANDO ESTUPIÑAN VARGAS

Gerente de Planeación y Proyectos

Dra. EDITH MILENA CABEZAS

Directora de Infraestructura FONTUR

Dra. ANGELICA GOMEZ NOSSA

Directora de Seguimiento y Análisis FONTUR

Dr. ANDRES FELIPE HERNANDEZ

Director Jurídico FONTUR

Ciudad

Asunto: INFORME DE PROYECTOS EN SEGUIMIENTO ESPECIAL AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Respetados doctores, cordial saludo

De acuerdo con la información recibida hasta el 12 de septiembre de 2022, presentamos el resultado de la actualización al seguimiento de los proyectos catalogados en seguimiento especial, así:

I. OBJETIVO

Realizar seguimiento a las acciones y gestiones para la normalización de los proyectos que presentan inconvenientes en su normal ejecución de acuerdo con el proceso de Gestión de Proyectos.

II. ALCANCE

El seguimiento se limita a los proyectos objeto de seguimiento histórico y a la información de nuevos proyectos suministrada por las áreas misionales del P.A. FONTUR.

III. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Veinticinco (25) proyectos por un valor total de \$153.371 Millones (Aportes de FONTUR \$116.951 Millones) en seguimiento especial, los cuales hemos distribuido en dos grupos, así:

GRUPO	Cuenta de VALOR TOTAL PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	APORTES ENTES TERRITORIALES (OTROS)	EFFECTO FINANCIERO (1)
1. Proyectos con hallazgos, indagaciones o investigaciones	12	\$ 95.842	\$ 62.874	\$ 32.969	\$ 32.184
2. Proyectos sin hallazgos de entes de Control	13	\$ 57.529	\$ 54.078	\$ 3.451	
Total general	25	\$ 153.371	\$ 116.951	\$ 36.420	\$ 32.184

a. PROYECTOS CON HALLAZGOS, INDAGACIONES O INVESTIGACIONES REALIZADAS POR ENTES DE CONTROL (CONTRALORÍA, PROCURADURÍA, FISCALÍA)

Cifras en millones de pesos

No.	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	CONTRA PARTIDA	EFFECTO FINANCIERO (1)
1.1	PFPT-043-09	AD-01-14 ADICIÓN AL PROYECTO CABLE AÉREO SECTOR CABLE PLAZA - LOS YARUMOS	\$ 1.430	\$ 1.430	\$	\$
1.2	FNTP-161-2016	CIRCUITO ECOTURÍSTICO POR LOS PUEBLOS PALAFITOS DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA	\$ 13.030	\$ 13.030	\$	\$ 13.020
1.3	FNTP-021-2015	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOVÍA EN PUERTO NARIÑO, AMAZONAS	\$ 5.941	\$ 5.941	\$	\$ 4.897
1.4	DVT-701-2011	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA FLOTANTE JUNTO AL MUELLE EXISTENTE JOHNNY CAY Y DEL MUELLE LANCHEROS	\$ 10.823	\$ 8.023	\$ 2.800	\$
1.5	FNTP-196-2015	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO "ECOTURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"	\$ 2.478	\$ 2.478	\$	\$ 2.222
1.6	FNTP-111-2014	CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES - EXPOFERIAS, MANIZALES	\$ 8.449	\$ 7.998	\$ 450	\$ 7.974
1.7	FNTP-168-2017	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA SERRANÍA ALTO DEL NUDO, COMO DESTINO DE TURISMO DE NATURALEZA	\$ 980	\$ 730	\$ 250	\$ 222
1.8	FNTP-213-2015	RESTAURACIÓN DEL MUELLE DE PUERTO COLOMBIA, ATLÁNTICO	\$ 19.636	\$ 5.000	\$ 14.636	\$

No.	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	CONTRA PARTIDA	EFFECTO FINANCIERO (1)
1.9	FNTP-199-2014	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO ECOLOSÓ, MUNICIPIO DE COLOSO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	\$ 5.852	\$ 5.852	\$	\$ 3.043
1.10	FNTP-233-2017	ADECUACIÓN PLAZA CENTRAL DE CIÉNAGA	\$ 24.360	\$ 9.527	\$ 14.833	\$ 544
1.11	FNTP-289-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TEATRO SANTA MARTA	\$ 275	\$ 275	\$	\$ 261
1.12	FNTP-166-2020	APOYO A LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA ISLA DE PROVIDENCIA PARA RECUPERACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	\$ 2.588	\$ 2.588	\$	\$
TOTAL			\$ 95.842	\$ 62.874	\$ 32.969	\$ 32.184

(1) EFECTO FINANCIERO: Corresponde al valor del hallazgo establecido por el ente de control.

b. PROYECTOS SIN HALLAZGOS DE ENTES DE CONTROL

Corresponden a proyectos con situaciones que dificultan su normal evolución, identificados por los Directores Misionales:

Cifras en millones de pesos


No.	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	CONTRAPARTIDA
2.1	FNTP-052-2014	OBSERVATORIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA ON-LINE CON APLICACIONES WEB Y MÓVIL	\$ 140	\$ 140	\$
2.2	DVT-1114E-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE NÁUTICA MIXTA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA	\$ 298	\$ 298	\$
2.3	FNTP-130-2015	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PEATONAL Y SU CONEXIÓN VEHICULAR EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 984	\$ 984	\$
2.4	FNTP-160-2016	CONSTRUCCIÓN SENDEROS CAÑO CRISTALES	\$ 4.000	\$ 3.750	\$ 250
2.5	FNTP-263-2017	I FASE PARQUE ARQUEOLÓGICO SAN AGUSTÍN: ALTO DE LOS ÍDOLOS	\$ 7.824	\$ 7.824	\$
2.6	FNTP-092-2018	CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA LA LICORERA EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE	\$ 2.500	\$ 2.500	\$
2.7	FNTP-007-2020	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE PLAYAS FASE II DOTACIÓN DE SEÑALES EN EL ÁREA TURÍSTICA DE CHOLÓN, ISLA BARÚ, DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.262	\$ 2.262	
2.8	FNTP-192-2020	REHABILITACIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO DE EMBARQUE DE PASAJEROS EL COVE DE SAN ANDRÉS – DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$ 1.039	\$ 1.039	\$
2.9	FNTP-003-2020	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA	\$ 561	\$ 561	\$
2.10	PDE-007-2013	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA UKUMARÍ	\$ 33.700	\$ 30.700	\$ 3.000

No.	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	CONTRAPARTIDA
2.11	FNTP-025-2018	SENDEROS ANCESTRALES ECOTURÍSTICOS DE LA ZONA EL VALLANO EN ENVIGADO, ANTIOQUIA	\$ 982	\$ 781	\$ 201
2.12	PDE 005-2014	SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIESGO AL TURISTA – SOS DE LA REGIÓN ATRATO GRAN DARIÉN	\$ 3.040	\$ 3.040	\$
2.13	DVT-1114C-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE LA CASA MUSEO DE GABO EN ARACATACA	\$ 200	\$ 200	\$
			\$ 57.529	\$ 54.078	\$ 3.451

El detalle de estos proyectos y de las acciones establecidas para su normalización, se encuentra en el Anexo en Excel "**Proyectos en Seguimiento Especial 12092022**" que incluye entre otra, la siguiente información:

- Código y nombre del proyecto
- Objetivo del proyecto
- Gerencia Responsable
- Profesional responsable
- Fecha de aprobación del Comité Directivo.
- Antecedentes del proyecto
- Estado actual
- Riesgos
- Observación antes de control
- Reporte de obras inconclusas
- Plan de mejora CGR (Si/No)
- Acciones jurídicas (Si/No)
- Reclamación de pólizas (Si/No)
- Acciones de mejora
- Fecha de compromiso acciones de mejora
- Responsable
- Gestiones realizadas

Como resultado de los seguimientos efectuados, se han establecido con las áreas involucradas 70 acciones las cuales se encuentran en el siguiente estado:

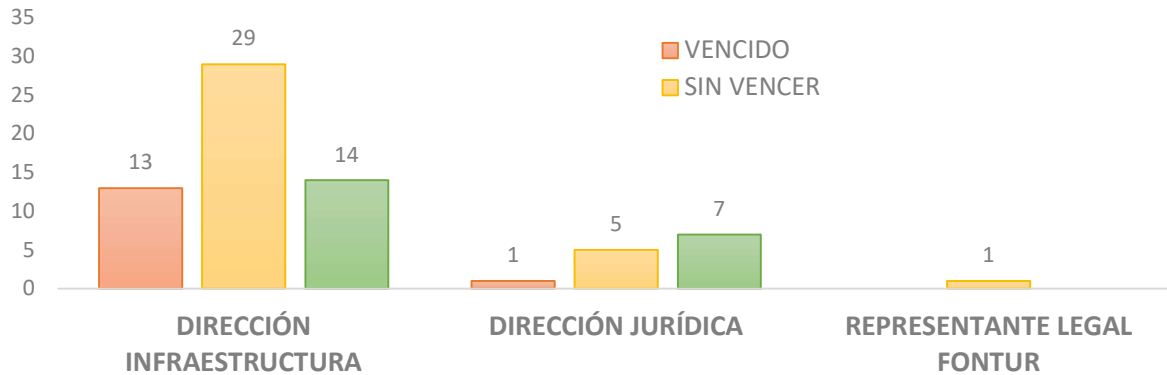

El Excel adjunto contiene el detalle de la gestión adelantada al 12 de septiembre de 2022 sobre cada una de las acciones definidas.

IV. PROXIMO SEGUIMIENTO:

Con el propósito que realizar seguimiento a la evolución de las acciones de mejora comprometidas, solicitamos actualizar e incluir en el archivo de Excel adjunto el avance de las acciones así como remitir las evidencias de la ejecución de las actividades definidas desde cada área para su normalización el 20 de octubre de 2022. En caso de que la acción no se hubiere realizado en las fechas establecidas, indicar su justificación y acción de remediación inmediata.

Cordialmente,

DANIEL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ

Director de Auditoría Interna P.A. FONTUR

- cc.
- Damarys Novoa Alfonso – Vicepresidente de Negocios FIDUCOLDEX S.A
 - Edwin Ricardo Horta – Gerente Jurídico FIDUCOLDEX S.A
 - Augusto Fabio Delgadillo – Gerente de Auditoría Interna FIDUCOLDEX S.A
 - Adriana Lucia Corena - Directora de Promoción y Mercadeo FONTUR
 - Myriam Johanna Gallego - Directora de Competitividad FONTUR
 - Lina María Samper – Profesional Senior de Planeación y Proyectos P.A. FONTUR
